



VER. PROJ. – STR – 004/2025 – 071

Ao

Ilmo. Dr.

Engº Lionel Pereira Terci

Engenheiro Preposto

Assunto: Projeto executivo

Referência: CO071/2024DT - CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO EM WHITETOPPING NA PRC-280, ENTRE CLEVELÂNDIA E PATO BRANCO, NUMA EXTENSÃO DE 37,49 KM.

Prezado Senhor:

O CONSÓRCIO DE SUPERVISÃO E APOIO PARANAENSE STRASUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 54.498.309/0001-82, com sede na Rua Castelo de Sintra, nº 24, Castelo, Belo Horizonte/MG - CEP: 31330-200, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal, vem, mui respeitosamente perante V.Sas., em atendimento ao escopo do contrato nº CO032/2024-DT, cujo objeto é a contratação de empresa de consultoria para execução de serviços técnicos de supervisão e apoio à fiscalização da execução das obras de implantação, restauração e/ou ampliação de capacidade de rodovias e obras de arte especiais, por produto, no âmbito da Superintendência Regional Oeste e da Diretoria Técnica do DER/PR., no contrato CO071/2024-DT que consiste na contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de restauração em Whitetopping na PRC-280, entre Clevelândia e Pato Branco, numa extensão de 37,49 km, vem expor e requerer o que segue.

O CONSÓRCIO SANCHES TRIPOLONI CONSOL CLEVELÂNDIA PATO BRANCO no dia 25/03/2025 realizou através do ofício CST-CONSOL-071-418-009-2025 a entrega do projeto executivo do contrato supracitado. Desta maneira a fiscalização realizou a verificação do conteúdo entregue, e a seguir é enfatizado os pontos a serem corrigidos ou justificados.

- **Geométrico**

As etiquetas das paradas de ônibus ficaram confusas e não seguiu o mesmo padrão do projeto básico onde indicava o meio da parada de ônibus, e no projeto executivo indica o início da parada de ônibus, porém a etiqueta está no meio da parada, como pode ser observado na imagem abaixo:

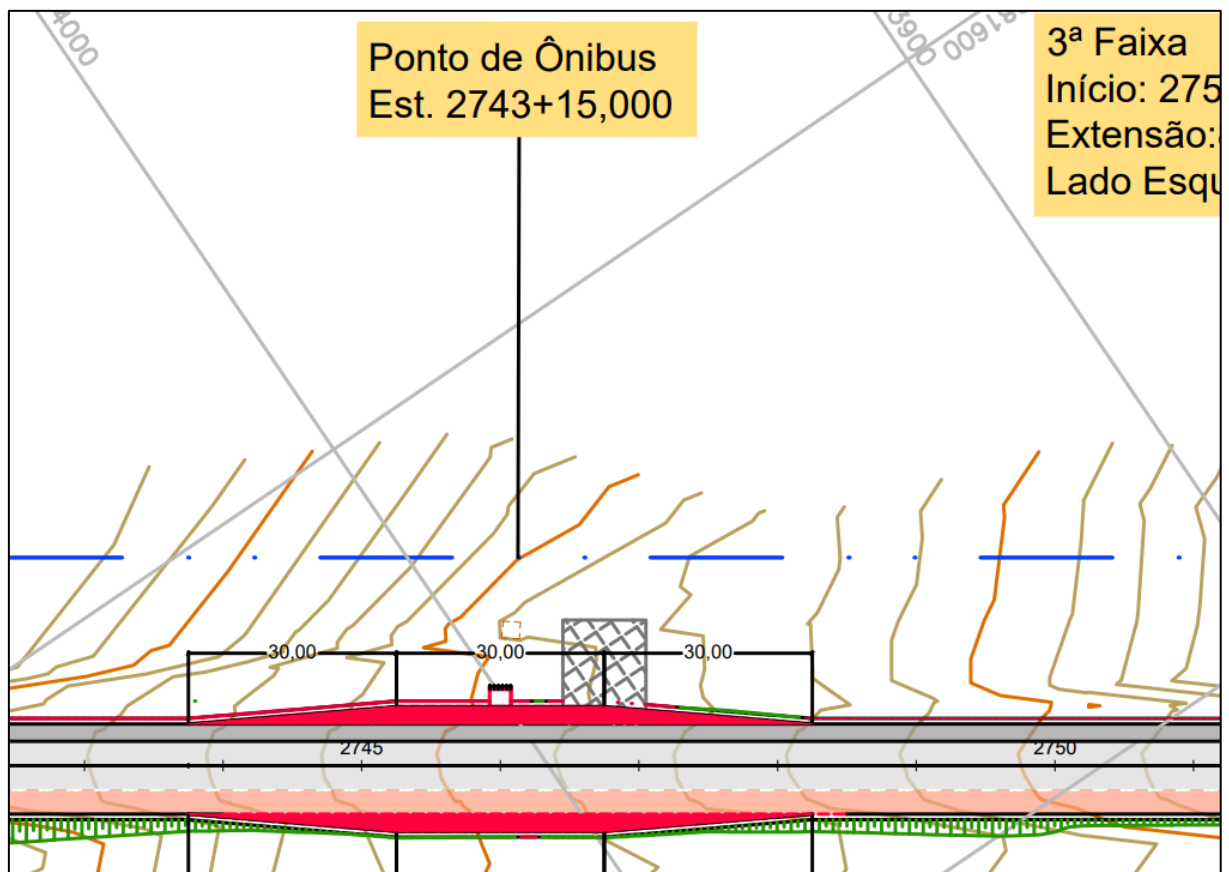


Figura 1 - Etiqueta localizada na estaca 2746+2,50, indicando estaca 2743+15,00

Conforme exposto acima solicitamos que seja corrigido as etiquetas com o mesmo padrão que foi desenvolvido o projeto básico.

- **Pavimentação**

É necessário alterar as posições das paradas de ônibus, para ficar como está no projeto geométrico.

- **Sinalização**

Não foi incluído as placas de informação “antes de construir às margens da rodovia...”, solicitamos a inclusão destas.

- **Drenagem**

Solicitamos que seja mantido a cor da representação das faixas adicionais, a mesma cor do projeto básico, visto que a cor utilizada no projeto executivo ficou a mesma do meio-fio, dificultando a interpretação. Como pode ser observado na imagem a seguir:

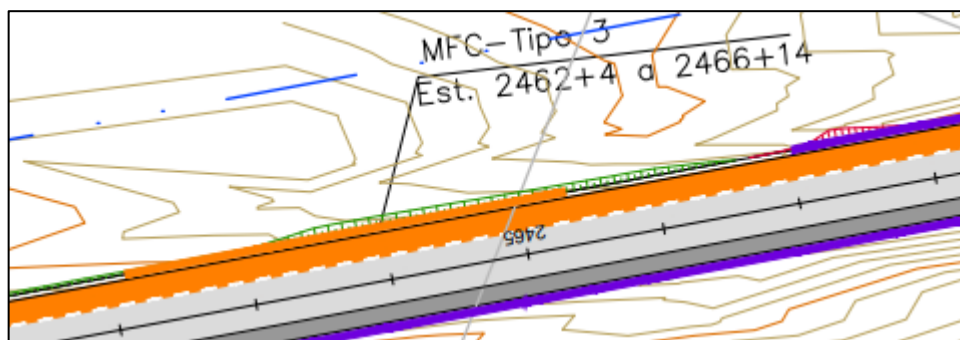


Figura 2 – Representação de elementos com a mesma cor

Ainda se tratando de meio-fio, solicitamos que seja revisto a concepção dos que foram acrescentados no projeto, visto que estão sem descidas d'água. Desta maneira é necessário a inclusão das entradas d'água, descidas d'água, bem como os dissipadores.

Outro fator relevante a localização de meio-fio, foi identificado que existe dispositivos que estão projetados em uma curva, porém do lado externo da curva, ou seja, no ponto alto da superelevação, conforme pode ser observado na imagem a seguir:

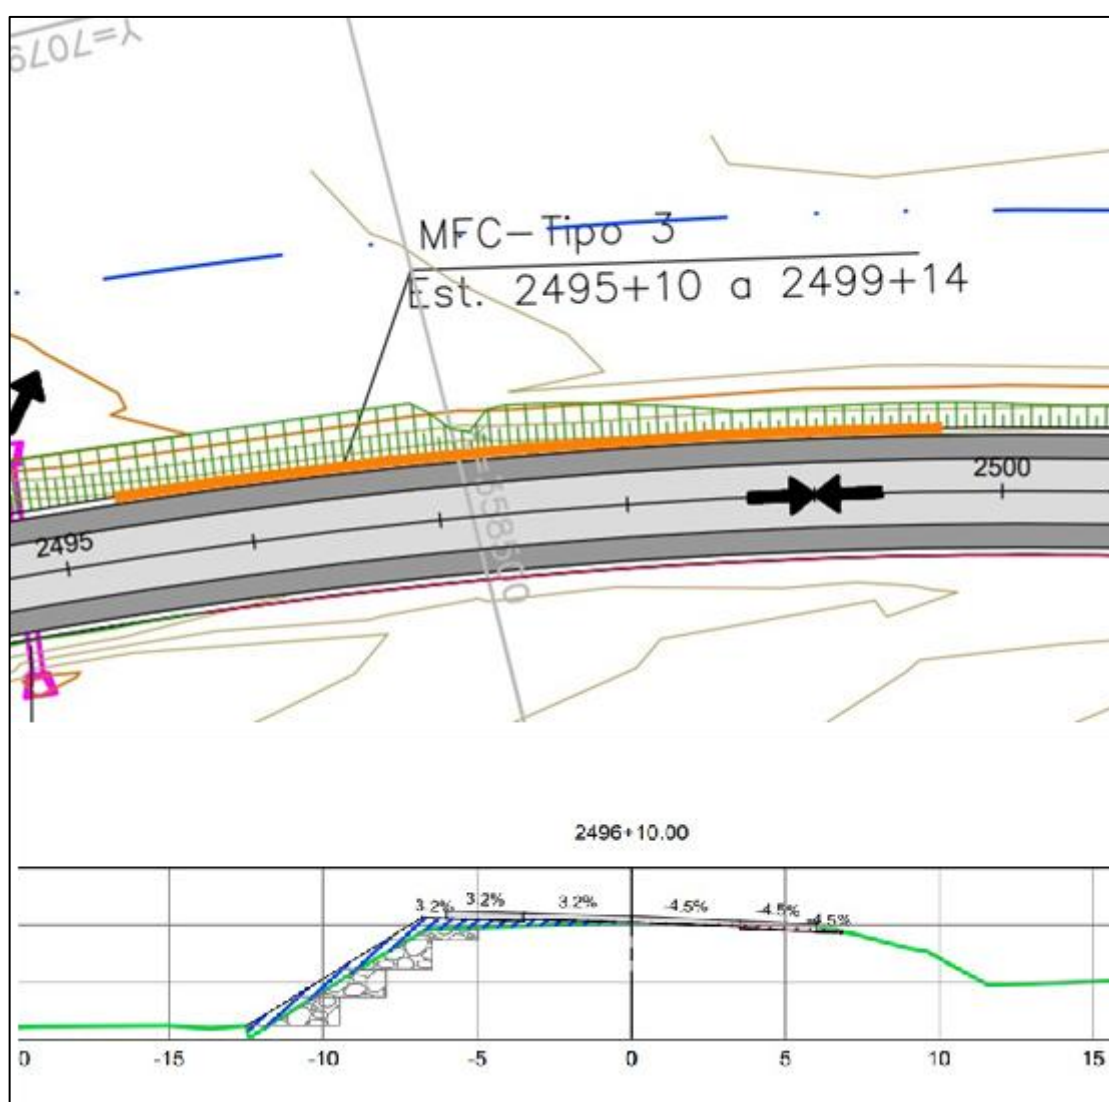


Figura 3 - Indicação de meio-fio do lado alto da elevação da curva

Para que o projeto de drenagem seja mais bem avaliado, por esta supervisão é necessária uma revisão minuciosa por parte do CONSÓRCIO SANCHES TRIPOLONI – CONSOL, visto que este contém muita poluição e não conseguimos distinguir qual é o

dispositivo correto que está sendo proposto para o local, bem como alguns estão perdidos no projeto. Como pode ser observado na imagem a seguir, onde é projetado em cada lado da rodovia uma entrada d'água, uma descida d'água e um dissipador no meio da sarjeta:

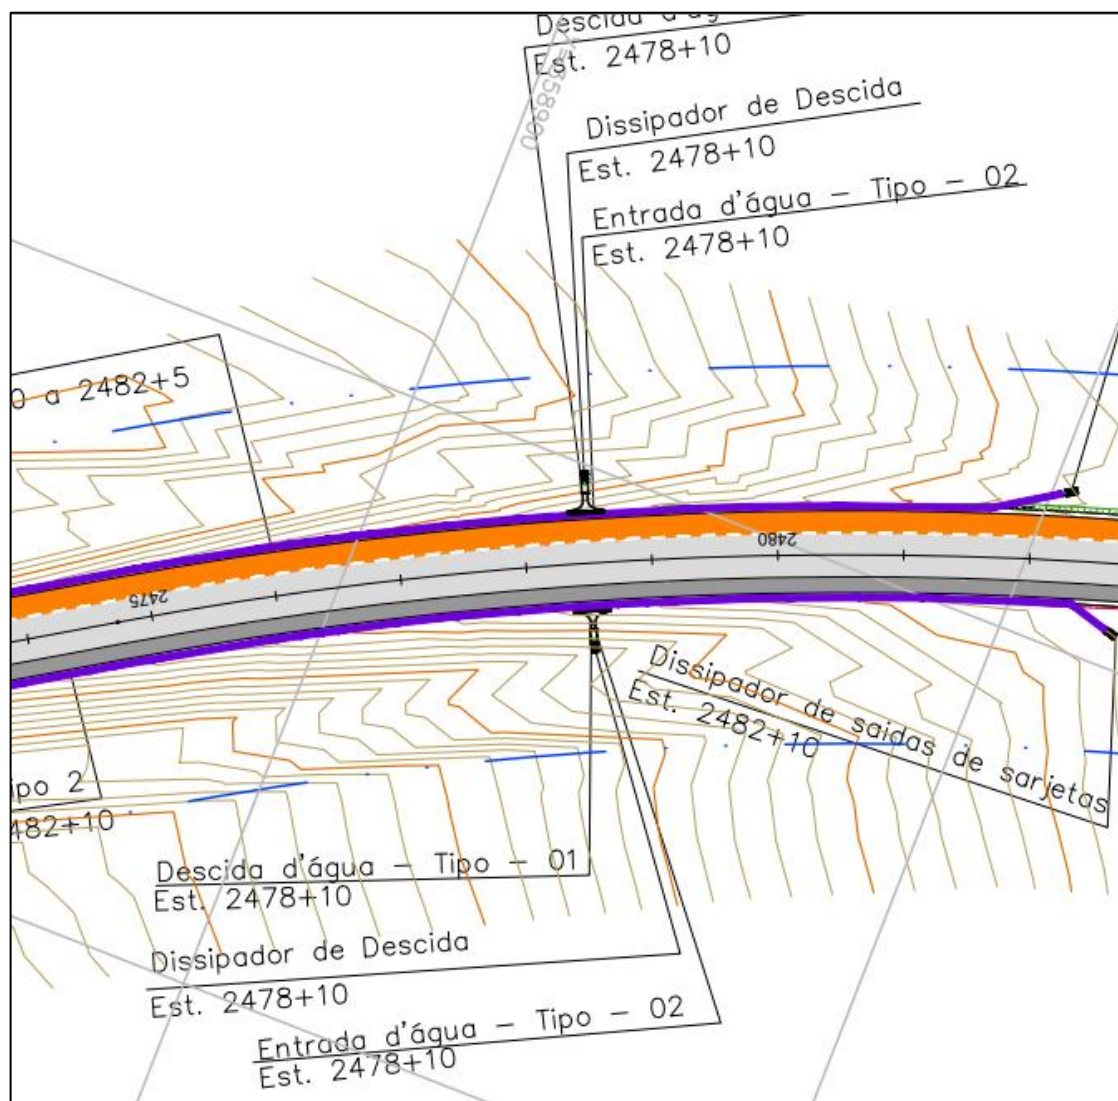


Figura 4 – Indicação de elementos de drenagem

Neste mesmo ponto as seções terraplenagem indicam que é talude de corte em ambos os lados da rodovia, como pode ser observado na imagem a seguir:

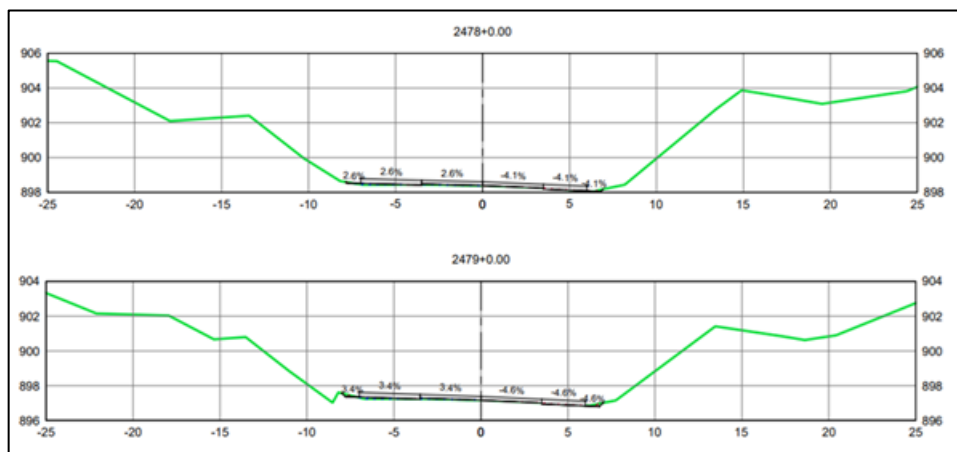


Figura 5 - Seções do projeto de terraplenagem

Desta maneira o projeto de drenagem é devolvido ao consórcio para uma revisão completa, mas que não seja feita nenhuma alteração do que já foi definido com a fiscalização, apenas corrija os erros de projeto. Reforçando que os erros apontados acima são apenas exemplos existe em outros locais do projeto o mesmo tipo de erro.

- **Avaliação geral**

Conforme exposto acima solicitamos que seja revisado o projeto executivo e feito uma nova entrega.

Com o intuito de melhorar o entendimento do projeto o consórcio deve atender aos critérios especificados no ANEXO I ATOS PREPARATÓRIOS E TERMO DE REFERÊNCIA CI N.º 06/2023 – DER/DT/CPAO e normas vigentes. Qualquer alteração das características e dimensões do anteprojeto, deverão ser plenamente justificadas com os devidos cálculos necessários, bem como deverá haver a anuência do responsável pelo anteprojeto, garantindo assim, que estas alterações não venham prejudicar a vida útil da rodovia.

Sendo o que tínhamos para o momento.



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR
ESCRITÓRIO REGIONAL VALE DO CHOPIM – PATO BRANCO



Pato Branco, 16 de abril de 2025

Engº. Edelson França
CONSÓRCIO DE SUPERVISÃO E APOIO PARANAENSE STRASUL

De acordo:

Engº. Paulo Roberto Melani
Gerente de Obras e Serviços
DER/PR – ERVC/Pato Branco

Recebido:

Data:
